

**FRANCISCO
ANDRAMUÑO R.**
ALCALDE



**MUNICIPIO
DE MORONA**



RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

ÍNDICE

- 1 Obras Públicas
- 2 Agua Potable y Alcantarillado
- 3 Tránsito
- 4 Cultural, Deportivo y Artístico.
- 5 Gestión Social
- 6 Economía Solidaria
- 7 Seguridad Ciudadana
- 8 Concejo Municipal del Cantón Morona
- 9 Autogestión Alcaldía
- 10 Convenio de Cooperación con Transferencia de Recursos
- 11 Temas de Consulta Ciudadana 2023

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Presupuesto 2023:

Presupuestado \$ 45'411.677,13

Ejecutado: \$ 24'901.358,92

Porcentaje devengado: 54,83%



OBRAS PÚBLICAS

Obras de Ejecución

Regeneración Urbana de las calles Sucre, Cuenca, Don Bosco y Av. 29 de Mayo.

Monto:

\$ 1'292. 007, 46

Beneficiarios:

15.000 habitantes



Obras de Ejecución

Construcción del Mercado Municipal y Centro Comercial de Macas, cantón Morona.

Monto:

\$ 5'108. 985, 72

Beneficiarios:

30.000 habitantes



**FRANCISCO
ANDRAMUÑO R.**
ALCALDE



**MUNICIPIO
DE MORONA**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS 2023**

Obras de Ejecución

Regeneración Vial y Urbana de la Av. Jaime Roldós Aguilera Etapa 1.

Monto:

\$ 1'280.369,40

Beneficiarios:

30.000 habitantes



Obras de Ejecución

Construcción del Centro de Entrenamiento de Deportes de Combate – Sevilla Don Bosco.

Monto:

\$ 399.250,74

Beneficiarios:

10.000 habitantes



Obras de Ejecución

Repotenciación del Teatro Municipal Washington Ricaurte

Monto:

\$ 367.058,12

Beneficiarios:

45.000 habitantes



**FRANCISCO
ANDRAMUÑO R.**
ALCALDE



**MUNICIPIO
DE MORONA**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS 2023**

Obras de Ejecución

Adecuación de Espacios Deportivos del cantón Morona

Monto:

\$ 399.250,74

Beneficiarios:

45.000 habitantes



Obras de Ejecución

Adecuación de césped sintético del estadio de la parroquia General Proaño.

Monto:

\$ 375.009,40

Beneficiarios:

10.000 habitantes



Obras de Ejecución

Adecuación de la calle Soasti entre Patrocinio Jaramillo y Manuel Bejarano

Monto:

\$ 107.521,19

Beneficiarios:

35.000 habitantes



Obras de Ejecución

Construcción de la Plazoleta Comercial en la parroquia Sinaí

Monto:

\$ 102.153,79

Beneficiarios:

4.000 habitantes



Obras de Ejecución

Reubicación temporal de comerciantes del actual Mercado Central y Centro Comercial de la ciudad de Macas.

Monto:

\$ 89.999,94

Beneficiarios:

176 comerciantes



Obras de Ejecución

Segunda fase de reubicación temporal de comerciantes del actual Mercado y Centro Comercial de la ciudad de Macas

Monto:

\$43.481,10

Beneficiarios:

46 comerciantes



Obras de Ejecución

Construcción del Cerramiento para la Cancha del Estadio de General Proaño

Monto:

\$ 71.218,59

Beneficiarios:

5.000 habitantes





2

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Construcción del Alcantarillado Pluvial y Sanitario para la parroquia San Isidro del cantón Morona – provincia de Morona Santiago.

Monto:

\$ 3'450.995,13

Fiscalización de la Construcción del Alcantarillado Pluvial y Sanitario para la parroquia San Isidro del cantón Morona.

Monto:

\$ 120.415,96

Beneficiarios:

2.000 habitantes



Obras de Ejecución

Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable para el Centro Parroquial General Proaño y la ciudad de Macas

Monto:

\$ 2'000.002,00

Beneficiarios:

30.000 habitantes



**FRANCISCO
ANDRAMUÑO R.**
ALCALDE



**MUNICIPIO
DE MORONA**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS 2023**

Obras de Ejecución

Construcción del Sistema de Alcantarillado Combinado y Separado S9 de la ciudad de Macas, cantón Morona.

Monto:

\$ 1'968.733,92

Beneficiarios:

4.000 habitantes.



Obras de Ejecución

Construcción del Alcantarillado Sanitario de los barrios 5 de Octubre y Tinguichaca Etapa 1.

Monto:

\$ 1'076.916,88

Beneficiarios:

2.000 habitantes



Construcción del Sistema de Agua Potable Regional para la parroquia Cuchaentza, cantón Morona.

Monto:

\$ 840.512,96

Fiscalización para el Sistema de Agua Potable de la parroquia Cuchaentza Etapa 1

Monto:

\$ 50.222,76

Beneficiarios:

1.000 habitantes



Obras de Ejecución


Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Zona 2: barrio Nueva Jerusalén y Lenin Moreno.

Monto:

\$ 368.124,61

Beneficiarios:

2.000 habitantes.

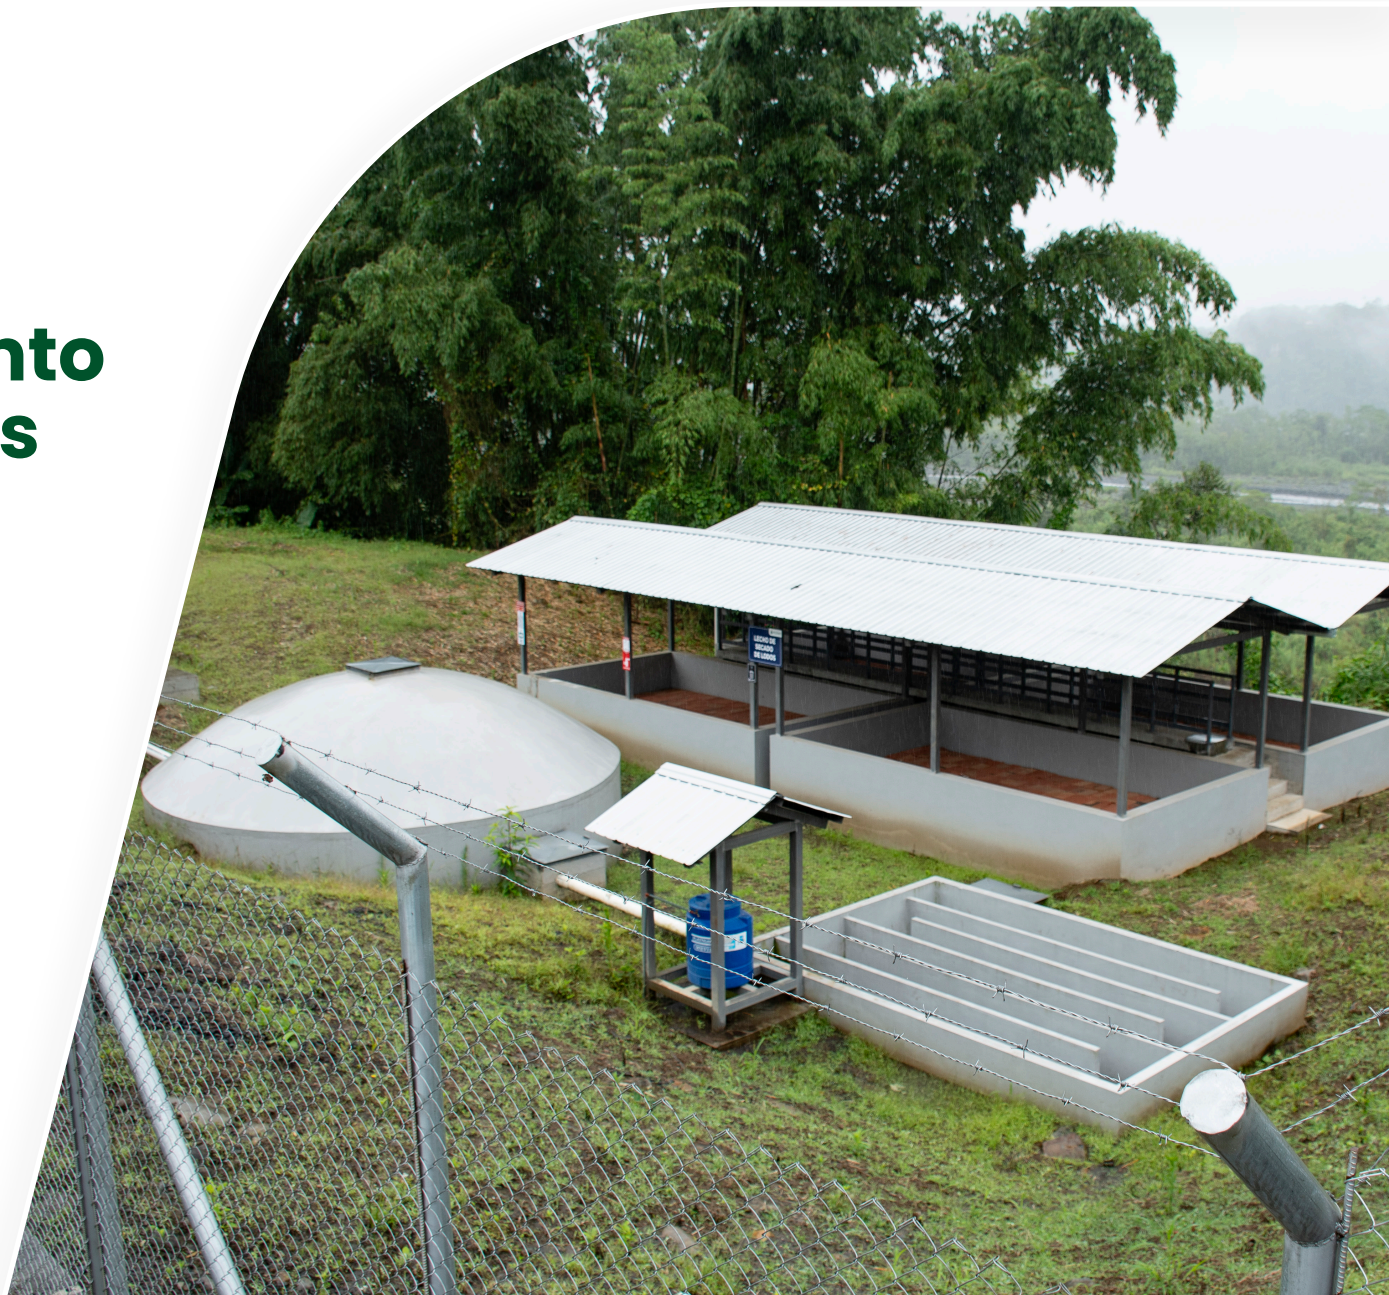

Obras de Ejecución

Construcción del Sistema de Agua Potable Regional San Luis, San Pedro, San Andrés, Las Palmeras y Sagrado Corazón de la parroquia Sevilla Don Bosco Etapa 1 y 2.

Monto:

\$ 1' 007.030,25

Beneficiarios:

3.000 habitantes



Obras de Ejecución

Construcción del Sistema de Alcantarillado para la Cabecera Parroquial de 9 de Octubre del cantón Morona.

Monto:

\$ 348.248.77

Beneficiarios:

1.000 habitantes



**FRANCISCO
ANDRAMUÑO R.**
ALCALDE



**MUNICIPIO
DE MORONA**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS 2023**

Estudio y Diseños Definitivos para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para los barrios Valle del Upano, Vergeles y Naranjal de la ciudad de Macas.

Monto:

\$ 77.316,73

Beneficiarios:

8.000 habitantes.




Actualización del Estudio del Sistema de Agua Potable Regional San Antonio de Quilamupi que comprende las comunidades Santa María de Tunants, Wapu, Los Canelos, San Antonio de Quilamupi, San Pedro y San Vicente, perteneciente a la parroquia Sevilla Don Bosco.

Monto:

\$ 57.153,37

Beneficiarios:

2.000 habitantes

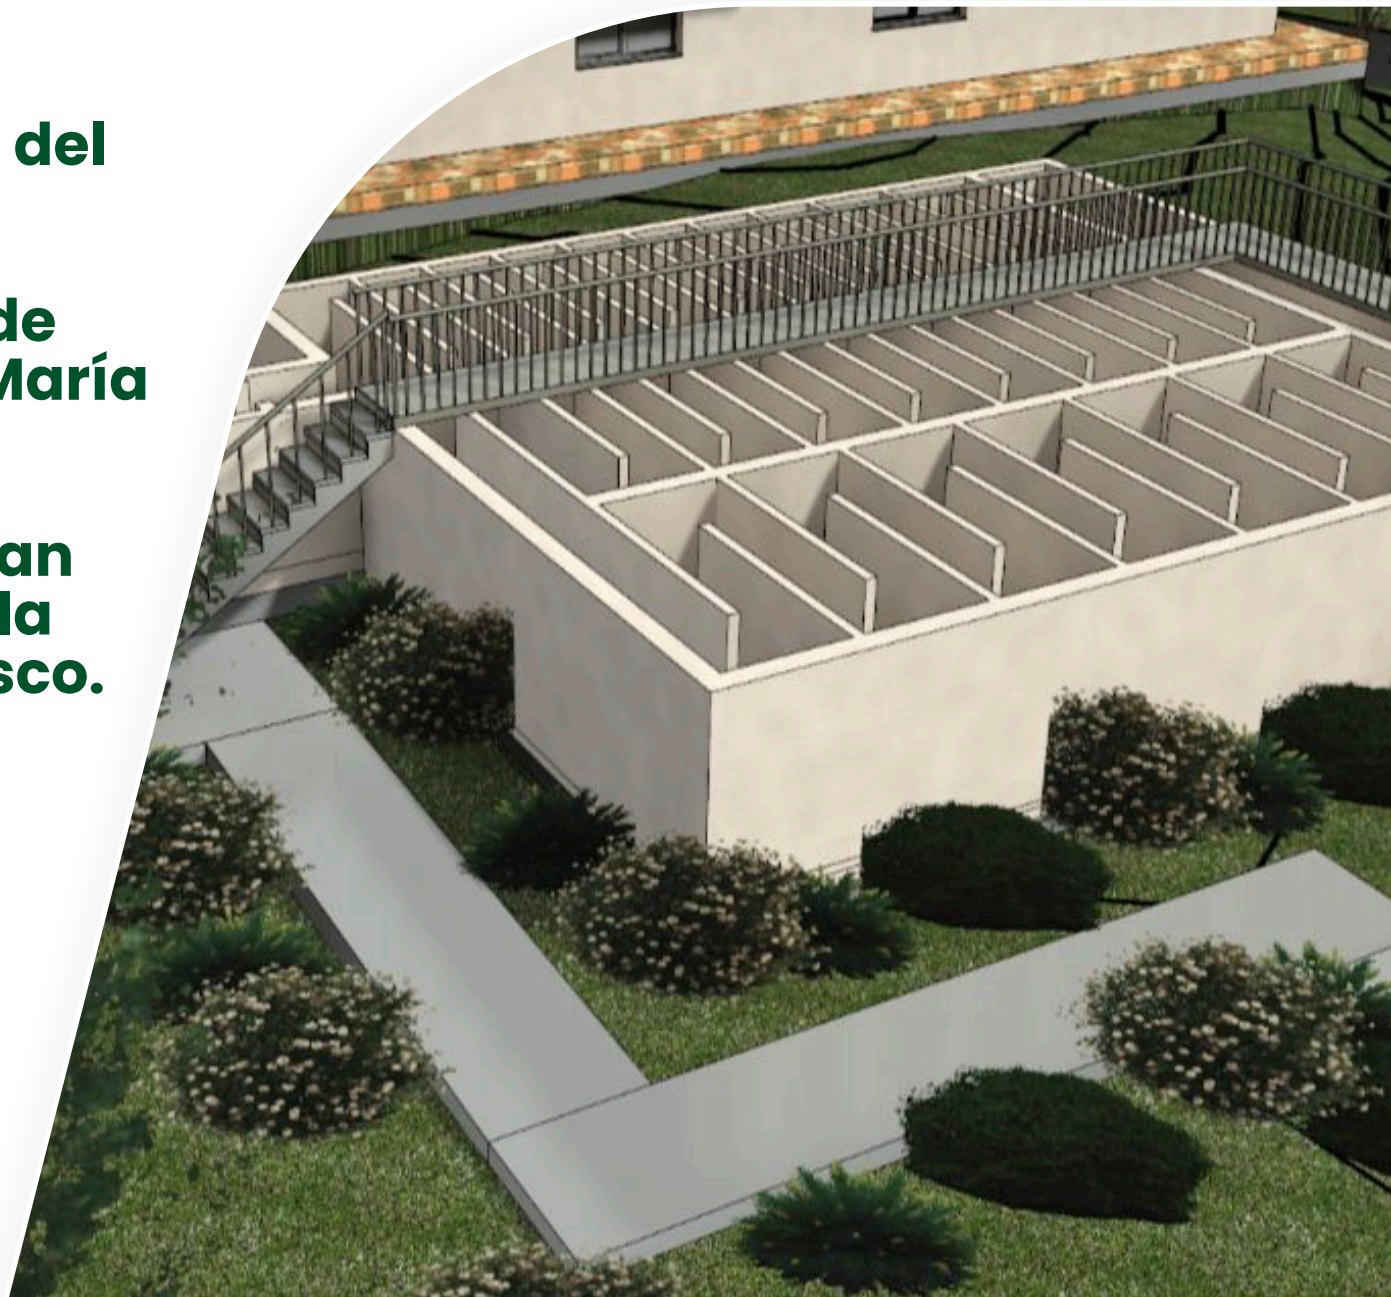

Estudios Definitivos del Sistema de Distribución de Agua Potable para el Centro Parroquial de General Proaño y la ciudad de Macas, cantón Morona.

Monto:

\$ 76.081,75

Beneficiarios:

5.000 habitantes



Estudios y Diseños Definitivos para la Construcción del Sistema de Agua Potable para la comunidad Numpaim de la Asociación Mankusas de Sevilla Don Bosco.

Monto:

\$ 83.943,87

Beneficiarios:

500 habitantes.



Estudios y Diseños Definitivos para la Construcción del Sistema de Agua Potable para la comunidad Antuni y Chumpi de la Asociación Miazal, perteneciente a la parroquia Sevilla Don Bosco.

Monto:

\$ 83.743,87

Beneficiarios:

1.000 habitantes



**Estudios y Diseños
Definitivos para la
Construcción del Sistema
de Agua Potable para la
comunidad Numpaim de la
Asociación Mankusas,
perteneciente a la
parroquia Sevilla Don
Bosco.**

Monto:

\$ 61.571,35

Beneficiarios:

500 habitantes.



3 TRÁNSITO

Plan de Movilidad Sostenible del cantón Morona

Monto:

\$ 54.977,00

Beneficiarios:

35.000 habitantes



**FRANCISCO
ANDRAMUÑO R.**
ALCALDE



**MUNICIPIO
DE MORONA**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS 2023**

Estudio de Necesidad del Transporte Comercial en Carga Liviana, Escolar Institucional y Definición de la Tarifa Urbana de Transporte Público y Comercial en Taxi Convencional.

Monto:

\$ 41.227,40

Beneficiarios:

35.000 habitantes



Suministro de Repotenciación e Instalación de las Intersecciones Semafóricas de la ciudad de Macas

Monto:

\$ 44.980,00

Beneficiarios:

35.000 habitantes



Adquisición de Señalización Horizontal para el Área Urbana del cantón Morona

Monto:

\$ 21.300,00

Beneficiarios:

35.000 habitantes



Construcción de 5 paradas para el ascenso y descenso de pasajeros del transporte público.

Monto:

\$ 12.500,00

Beneficiarios:

2.000 habitantes



**FRANCISCO
ANDRAMUÑO R.**
ALCALDE



**MUNICIPIO
DE MORONA**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS 2023**

Adquisición de Pintura Termoplástica Preformada para Numeración de Plazas de Estacionamiento Rotativo Tarifado

Monto:

\$ 6.168,50

Beneficiarios:

35.000 habitantes



Ejecución de 32 Señalizaciones Horizontales y Verticales y Semaforización. Trámites de Títulos Habilitantes y Trámites de Matriculación Vehicular.

Monto:

Administración Directa

Beneficiarios:

- **Trámites de Títulos Habilitantes:** Operadores de Transporte.
- **Trámites de Matriculación Vehicular:** Población del cantón Morona.
- **Señalización Vertical y Horizontal:** Población del cantón Morona.





**CULTURAL,
DEPORTIVO
Y ARTÍSTICO.**

Promoción de la Cultura, Arte, Deporte, Recreación y Turismo a realizarse en el mes de mayo.

Monto:

\$ 280.000,00

Beneficiarios:

40.000 habitantes del cantón Morona



**FRANCISCO
ANDRAMUÑO R.**
ALCALDE



**MUNICIPIO
DE MORONA**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS 2023**

Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas de Integración a realizarse en el mes de agosto.

Monto:

\$ 90.000,00

Beneficiarios:

22.000 habitantes de Macas.



Actividades Culturales y Artísticas, manteniendo las Costumbres y Tradiciones del cantón Morona

Monto:

\$ 29.667,50

Beneficiarios:

1.200 habitantes
(Río Blanco)



Fortalecimiento de la Gestión Cultural en el cantón Morona: "Sendas de la Integración Cultural por ti Morona".

Monto:

\$ 18.997,05

Beneficiarios:

40.000 habitantes del cantón Morona



Escuelas Deportivas

Monto:

\$101,828.63

Adquisición de implementos y uniformes para las Escuelas Deportivas del Municipio de Morona

Monto:

\$ 10.605,71

Beneficiarios:

500 niños, niñas y adolescentes del cantón Morona.



Impulso de las Tradiciones y Expresiones Artísticas, Culturales en el cantón Morona.

Monto:

\$ 17.413,68

Beneficiarios:

22.000 habitantes de Macas



Promoción y Fomento Deportivo en el cantón Morona.

Monto:

\$ 6.300,00

Beneficiarios:

200 beneficiarios directos



Espacios de Encuentros Deportivos Multidisciplinarios a realizarse en el cantón Morona 2023.

Monto:

\$ 88.500,00



**FRANCISCO
ANDRAMUÑO R.**
ALCALDE



**MUNICIPIO
DE MORONA**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS 2023**

Revitalización Cultural y Fomento de las Expresiones Artísticas, Culturales en el cantón Morona.

Monto:

\$ 58.512,58

Beneficiarios:

40.000 habitantes
del cantón Morona



Escuelas de Arte

Beneficiarios:

1.145 niñas, niños, jóvenes, adolescentes y personas con discapacidad.





GESTIÓN SOCIAL

Convenio con el MIES – CDI 6 Centros de Desarrollo Infantil

Monto:

\$ 460.819,93

Beneficiarios:

234 niñas y niños entre 12 y 36 meses de las parroquias Sevilla Don Bosco, Sinaí, Cuchaentza y San Isidro.



Programa vida activa y afectiva

Monto:

\$ 69.610,93

Beneficiarios:

399 adultos mayores y
18 personas privadas
de libertad



Fisioterapia: atención domiciliaria y en consultorio

Monto:

\$ 28.836,80

Beneficiarios:

35 personas
1.500 atenciones
durante el año



Aprovechando el Tiempo Libre Inglés

Monto:

\$ 12.766,67

Beneficiarios:

150 niñas, niños y adolescentes.



Charlas Vivenciales y de Interés Social

Monto:

\$ 21.718,80

Beneficiarios:

1.200 personas





ECONOMÍA SOLIDARIA

Matchmaking: BioMorona 2023 "Conectando Recursos y Oportunidades".

102 entrevistas con 13
empresas importantes
del país

Monto:

\$5.025,00

Beneficiarios:

10 asociaciones

Objetivo:

Buscar apertura comercial
y el fortalecimiento de las
asociaciones de la
Bioeconomía en la Región.



Capacitaciones a emprendedores, artesanos y servidores turísticos

Monto:

\$ 23.740,50

Beneficiarios:

200 personas



Ferias de Emprendimientos

Beneficiarios:

374 personas



**FRANCISCO
ANDRAMUÑO R.**
ALCALDE



**MUNICIPIO
DE MORONA**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS 2023**



SEGURIDAD CIUDADANA

Contrato de Consultoría para elaboración del Plan Cantonal de Seguridad Ciudadana, cantón Morona.

Monto:

\$ 24.000,00

Beneficiarios:

54 000 habitantes



**FRANCISCO
ANDRAMUÑO R.**
ALCALDE



**MUNICIPIO
DE MORONA**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS 2023**

Contratación de Asesoría especializada en Seguridad Ciudadana para Inicio-institucionalización de la Política Pública de Seguridad Ciudadana en el GAD Morona

Monto:

\$ 9.944,00

Beneficiarios:

54 000 habitantes



Adquisición de 56 cámaras de video vigilancia para monitoreo de los 23 barrios de Macas y accesos a la ciudad.

Monto:

\$ 121.991,00

Beneficiarios:

22 000 habitantes





CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA



ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

**FRANCISCO
ANDRAMUÑO R.**
ALCALDE



**MUNICIPIO
DE MORONA**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS 2023**

Sesiones Ordinarias	45
Sesiones Extraordinarias	11
Parcelaciones Agrícolas	9
Firmas de Convenios	11
Trámites de Subdivisión de Lotes	19
Titulación Adjudicación de Bien Vacante	4
Unificación de Lotes	13
Partición de Bienes	3
Creación de Ordenanzas Municipales	7
Reformas Municipales	4



AUTOGESTIÓN ALCALDÍA

Gestión de 3'003.813,68 ante la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA).

Para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial y Tratamiento de Aguas Residuales de los barrios Jardín del Upano, 5 de Octubre, Tinguichaca y parte del barrio Norte, La Florida y Nueva Jerusalén de la ciudad de Macas, cantón Morona.



Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Municipal del cantón Morona y la Universidad del Azuay, a través de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas.

Para ejecutar el Curso de Guía
Turístico Local, con una
duración de 516 horas
académicas, dirigido a 25
personas bajo la modalidad
híbrida.



Cooperación Interinstitucional de Uso y Ocupación Gratuito de Área entre el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP).

Se recibió 80 hectáreas para la gestión, conservación y uso sostenible para el ACUS Bosque Domono.

Convenio Interinstitucional Firmando entre el Gobierno Provincial y Municipio de Morona

Entrega de 8 cámaras trampa en comodato, que sirven para levantamiento de información de la fauna existente en el ACUS Bosque Domono.

Monto:

\$ 4.000





10

**CONVENIO DE
COOPERACIÓN
CON TRANSFERENCIA
DE RECURSOS**

Convenio de Cooperación Inter-institucional entre el Gobierno Municipal del cantón Morona y la Junta Nacional de Defensa del Artesano

Monto: \$ 5.000

Beneficiarios: 20 postulantes en
las ramas artesanales y de la
Economía Solidaria para el
curso de titulación artesanal
por práctica profesional.



Cooperación entre la Casa de la Cultura y el GAD Cantonal de Morona para impulsar el desarrollo cultural del Cantón, mediante la implementación de procesos artísticos – culturales.





11

**TEMAS DE CONSULTA
CIUDADANA 2023
PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

TEMAS DE CONSULTA CIUDADANA 2023.

¿Qué paso con el tema y recursos del alcantarillado sanitario para la parroquia 9 de Octubre?

- El proyecto el alcantarillado pluvial está a cargo de la Junta Parroquial con aporte del Gobierno Municipal del Cantón Morona \$60.000. - Y el alcantarillado sanitario se encuentra en ejecución por un monto de \$348.248,77. Con fecha de inicio 9 de marzo del 2024.

¿Qué pasaría con lo priorizado en el año 2023, reparación y mantenimiento del sistema de agua de Rio Blanco?

- Este proyecto se encuentra actualmente en proceso de terminación unilateral debido al incumplimiento por parte del contratista con las condiciones estipuladas en el contrato.

¿Cómo se encuentra el estado del proyecto del sistema de alcantarillado sanitario y fluvial de la cabecera parroquial de San Isidro?

- A la presente fecha se encuentra ejecutado el monto de 2'599,596.85 más IVA del contrato principal correspondiente al 75.33% y 104,281.76 más IVA del contrato complementario que equivale al 60.45% de avance de obra.

¿Cómo se encuentra el proyecto de regional de agua potable Eden, Domono, Huacho?

- Se va a contratar la consultoría en el primer cuatrimestre de este año. - El proyecto de Edén se va a cambiar la partida para mantenimiento del sistema existente por petición de la comunidad.

¿Por qué no se realizó" evaluación, estudios y diseños pp 2023 (¿plantas de tratamiento de aguas residuales del Jimbitono y Proaño? Y ¿por qué esta en un 0%?

- La decisión tomada fue la de repotenciar las plantas existentes. En este sentido, actualmente nos encontramos en la etapa de contratación del sistema eléctrico necesario para estas plantas. - Es importante destacar que la planta de Proaño ya está en funcionamiento, lo que demuestra un avance significativo en este aspecto.

¿Cómo se encuentra el estado del proyecto de la regional de agua potable para Cuchaentza 2da etapa de priorización 2023?

- Este proyecto se encuentra en proceso de gestión de recursos en la STCTEA, presentado en la postulación de proyectos aceptado en la primera instancia, adicionalmente se está por ejecutar una consultoría de actualización del proyecto

Señor Alcalde ¿Cómo se encuentra el proceso para la construcción del alcantarillado en la parroquia de Sinaí?

- Este proyecto está actualmente en la fase de legalización del terreno donde se llevarán a cabo las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs), un paso fundamental para obtener la viabilidad técnica necesaria.

¿En qué etapa se encuentra el proyecto de la construcción del alcantarillado en el Barrio Sangay?

- El proyecto de construcción del alcantarillado en el Barrio Sangay se encuentra actualmente en la fase de legalización del terreno donde se implementarán las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs), un paso fundamental para obtener la viabilidad técnica necesaria.

Puede informarnos sobre el proyecto en tres partes, construcción graderíos, Rio Blanco, Metzankim y Paus respectivamente.

Señor Alcalde. Respecto al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS PARA EL ESTADIO DE RIO BLANCO Y ESTADIO DE METSANKIM" me permito informar lo siguiente: Con fecha 31 de agosto de 2022, se suscribe el contrato de menor cuantía Nro. MCO-GMCM-008-2022 denominado "CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS PARA EL ESTADIO DE RIO BLANCO Y ESTADIO DE METSANKIM", suscrito entre el Ing. Franklin Galarza Guzmán, ex Alcalde del Cantón Morona y la Ing. Rosita Elena Andrade Ordoñez, Contratista. Con fecha 30 de enero de 2023 se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS PARA EL ESTADIO DE RIO BLANCO Y ESTADIO DE METSANKIM". Respecto al proyecto de Graderios para la comunidad de PAUS, no se podrá continuar con el proyecto, hasta que se resuelva la legalidad del predio donde se va a implantar los graderios.

¿Cómo se encuentra el estado del estudio del parque para General Proaño?

Respecto al "ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REGENERACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA PROAÑO, CANTÓN MORONA", me permito informar que, con fecha 24 de mayo de 2023, se suscribe el Acta de Entrega - Recepción, suscrita por Arq. Aurelio Zhunio Cruz, ADMINISTRADOR, Arq. Amada Orellana Ruiz, CONSULTORA, Ing. Álvaro Sangurima Armijos, DELEGADO. Actualmente los estudios reposan en el Departamento de Gestión de Planificación, en físico y digital.

¿Por qué no se ha tenido avance o ejecución del proyecto líneas de redes e instalaciones eléctricas para Huacho?

Respecto al proyecto de Redes e Instalaciones Eléctricas para Huacho, es necesario mencionar lo siguiente: Con fecha 30 de agosto de 2021, se firma el contrato entre el GAD Municipal del Cantón Morona y el Ing. Wilmer Genaro Heras Padilla, en donde se establece que, el contratista renuncia al anticipo, sin embargo, una vez seguido el debido proceso se da por terminación de mutuo acuerdo con fecha 17 de febrero de 2023, sin haber completado los trabajos. Con fecha 09 de noviembre de 2023, se publica el proceso en el Portal de Compras Públicas, sin embargo debido a que ningún oferente cumple con los requisitos para poder adjudicar el contrato, se procede a declarar Desierto mediante Resolución Nro. 0320-GMCM-CP-2023. Con fecha 11 de diciembre de 2023, se publica nuevamente el proceso en el Portal, sin embargo, debido a que solamente 1 oferente cumple con los requisitos, no se puede adjudicar, ya que, según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, deben existir dos o más ofertas habilitadas para el sorteo, se declara Desierto mediante Resolución Nro. GMCM-ALC-2024-0131-M. Con fecha 18 de marzo de 2024, se publica una vez más el proceso para su contratación en el Portal de Compras Públicas, actualmente se encuentra en la etapa de calificación de participantes, con fecha estimada de adjudicación para el 8 de marzo de 2024. Con estos antecedentes, es necesario mencionar que, la institución ha cumplido con lo establecido en la Ley y Reglamento General del Sistema Nacional de Contratación Pública, deslindando cualquier responsabilidad de la institución sobre el manejo del proceso.

¿Cómo se encuentra el estado de los estudios de los parques para Cuchaentza y Ebenecer? Queremos nos de a conocer y además si va ser considerado como prioridad con que presupuesto?

Respecto a los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE PARQUES Y ÁREAS VERDES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CUCHAENTZA Y COMUNIDAD DE EBENEZER DEL CANTÓN MORONA", me permito informar que, a los 3 días del mes de mayo de 2023 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva Unica, suscrita por Arq. Jocelyne González Tacuri, ADMINISTRADOR, Arq. Milton Paguay Quisphe, CONSULTOR y Arq. Aurelio Zhunio Cruz, DELEGADO. Actualmente los estudios reposan en el Departamento de Gestión de Planificación, en físico y digital. La priorización del proyecto se deberá realizar a través de las asambleas ciudadanas.

Señor Alcalde, ¿Podría entregarnos los productos finales de los estudios de consultoría de los parques para Cuchaentza y Ebenecer a las autoridades del GAD Parroquial?

Los productos reposan en el Departamento de Gestión de Planificación, se puede entregar la información, previa autorización del Alcalde, en versión digital.

Señor Alcalde: ¿Queremos conocer por que no se ejecuta el contrato de la Regeneración del Pasaje Los Canelos en el barrio Juan de la Cruz?

Respecto a la Regeneración del Pasaje Los Canelos me permito informar lo siguiente: Con fecha 31 de agosto de 2022, se celebra el contrato de menor cuantía de obra Nro. MCO-GMCM-009-2022, denominado "REGENERACIÓN DEL PASAJE LOS CANELOS (I ETAPA)", suscrito por el ex Alcalde del Cantón Morona, Ing. Franklin Galarza y la Ing. Yessennia Dolores Gómez Delgado, por un valor de USD 117,209.37, siendo Administrador el Ing. Sixto Javier Guzmán Lainez y Fiscalizador el Ing. Ivan Alvarez Acosta.

El plazo inicia con fecha 13 de septiembre de 2022 una vez que se ha notificado que el anticipo se encuentra acreditado.

Con fecha 14 de septiembre de 2022, se presentan inconvenientes para el avance de la obra con los moradores de la zona, quienes mencionan inconformidad con el diseño planteado, debido a estas circunstancias se procede a la suspensión de plazo con fecha 16 de septiembre de 2022.

Mediante Memorando Nro. GMCM-GOPM-2022-2456-M de fecha 19 de septiembre de 2022 y con insisto mediante Memorando Nro. GMCM-GOPM-2022-2729-M de fecha Memorando Nro. GMCM-GOPM-2022-2729-M de fecha 07 de octubre de 2022 suscrito por el Ing. Sixto Javier Guzmán Lainez, solicita al Departamento de Planificación, presentar alguna solución respecto a los inconvenientes presentados con el proyecto.

Mediante Memorando Nro. GMCM-GPLA-2022-1137-M de fecha 11 de octubre de 2022, suscrito por el Arq. Francisco Torres, ex Director de Gestión de Planificación, emite una respuesta en donde manifiesta que, se realizó una reunión de socialización con los moradores del Barrio Juan de la Cruz, en donde a solicitud de los propios moradores solicitaban facilitar el acceso con personas de movilidad reducida, por ende el proyecto fue cambiado y socializado, para lo cual se firmó un Acta de Socialización de la Regeneración del Pasaje los Canelos, con firmas de responsabilidad de los moradores.

Actualmente, el proyecto se encuentra suspendido, siendo responsabilidad del Administrador, desde la firma del contrato, el hacer cumplir o no el objeto contractual.

¿Queremos conocer qué porcentaje se invirtió en el área de seguridad ciudadana y en que programas en el año 2023?

OBJETO	VALOR	% DE CUMPLIMIENTO
Contrato de Consultoría para la elaboración del Plan Cantonal de Seguridad Ciudadana - Cantón Morona	24000	100
Contratación de asesoría especializada en seguridad ciudadana para inicio de Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Ciudadana en el GAD Morona	9944	100
Adquisición de 56 cámaras de video vigilancia para monitoreo de los 23 barrios de Macas y accesos a la ciudad.	121991	100

Queremos conocer ¿Cómo se encuentra el proceso del proyecto construcción puente sobre el Rio Quebrada?

Actualmente la fiscalizadora del contrato Ing. Cristina Sanunga esta indispuesta con permiso medico más de tres meses y no está laborando, por tanto, el administrador de contrato Ing. Javier Guzmán explica que el contrato tuvo inconvenientes en la etapa de construcción de la obra, al iniciar con las excavaciones y cimentación del estribo provoco deslizamientos de los taludes causando un alto riesgo a las viviendas cercanas, esto provocaría que sean afectadas parcial o en su totalidad. Al ser un diseño entregado por el GAD Provincial de Morona Santiago se realiza respectivo rediseño que solventa los inconvenientes y posibles afecciones a las viviendas que podrían ser afectadas, pero debido a que existió discrepancias con el contratista no se continuo con la ejecución de la obra y se planteó la terminación por mutuo acuerdo, luego la terminación unilateral del contrato y posterior a esto el contratista realiza el juicio para este contrato en contra del GMCM.

¿Qué paso con la ejecución de muros, veredas y bordillos en la ciudad de Macas?

Para el proyecto de muros, veredas y bordillos se ha considerado para el presupuesto participativo y contratarse en el año 2024, este proyecto acorde a la planificación se realizará en el segundo semestre del año en curso. Actualmente se encuentra en la etapa de elaboración del proyecto, mediante el levantamiento de información pormenorizado de las veredas a ser intervenidas en coordinación con el Departamento de Planificación y Agua Potable. Luego se continuará con la elaboración de la elaboración de planos, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de precios unitarios y posteriormente tener listo para el segundo semestre iniciar con el proceso de contratación.

¿Por qué no se concluye con el contrato de la obra de la Av. Jaime Roldós Aguilera?

La obra actualmente se mantiene suspendida, la Dirección de Aviación Civil DAC solicita que los postes de luz sean de menor altura y la Centro Sur ha solicitado realizar la actualización y diseño eléctrico. Esto se ha venido entregando acorde a los requerimientos, ya se cuenta con la aprobación de alturas de la DAC y como último requerimiento de la Centro Sur se entregó el diseño eléctrico que abastezca las acometidas subterráneas que se encuentran próximas al aeropuerto. Esta ha sido el motivo por el cual no se ha podido reiniciar con el proyecto ya que es necesario la aprobación de los planos eléctricos. Esta ya entregada con todo lo solicitado y la empresa emitirá la aprobación para continuar con los trabajos. Adjunto oficio de requerimientos de la Centro Sur.

¿Por qué no se concluye con los trabajos preliminares de las calles de los barrios La Unión y 27 de febrero según convenio suscrito con el Gobierno Provincial, para el asfaltado de las mismas?

La obra denominada ASFALTADO DE CALLES PARA LOS BARRIOS 27 DE FEBRERO, LA UNIÓN, LA BARRANCA Y JUAN DE LA CRUZ DE LA CIUDAD DE MACAS 2022 se ha mantenido suspendida debido a que varias vías correspondientes al proyecto no contaban con la estructura de mejoramiento, debido a que en los estudios no se contempló estos trabajos y que son necesarios ejecutarlos para garantizar la estructura de la vía. Por tanto, el GMCM mediante el departamento de Obras Publicas procede a la ejecución del mejoramiento de las vías por administración directa, luego de su ejecución se realiza las pruebas de densidades que una vez aprobadas se procede a realizar el informe favorable para el reinicio de los trabajos. Actualmente el contratista se encuentra realizando el stock y tendido de subbase en las calles del barrio 27 de febrero, posterior a que se termine el tendido se continuara con la base. Una vez que sea concluido el tendido de la base y se apruebe las densidades se solicitara al GADPMS se disponga la colocación del asfalto.

¿Podría informarnos de manera detallada sobre el estado de la construcción del Plan Parques para los barrios de la ciudad de Macas? ¿y por qué los juegos colocados no cumplen con los planos y especificaciones técnicas del contrato.

La obra denominada CONSTRUCCIÓN DEL PLAN PARQUES EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE MACAS FASE 1, se inició el 7 de septiembre de 2022. La obra ha presentado varios inconvenientes entre los cuales detallo a continuación: La empresa Centro Sur solicita actualización del estudio eléctrico. Se detecta que en los planos contractuales existe errores debido a que no coincide los planos con el barrio correspondiente. 3 No se establecen las dimensiones de los juegos en los planos ni en las especificaciones técnicas lo cual no permite realizar una correcta fiscalización y el contratista no puede ejecutar estos rubros.

Las especificaciones técnicas son generales para los juegos, es decir no está completa y en varios juegos no se establece el tipo de materiales. Los tipos de sujeciones que constan en las especificaciones técnicas no garantizan la seguridad y durabilidad en los juegos. Acorde a lo antes expuesto, se ha suspendido la obra hasta dar solución a estos inconvenientes presentados. Se ha mantenido reuniones de trabajo periódicas entre fiscalización, contratista y administrador de contrato y se ha tomado las medidas correctivas para cambiar las sujeciones, realizar nuevamente la aplicación de pintura. Se ha solicitado al departamento de planificación la aclaración o alcance referente a los materiales y garantías de los juegos que deben especificarse. Al momento están en trabajos de correcciones y mejoras a los juegos, una vez que se hayan realizado los correctivos se evaluara nuevamente y verificara que quede garantizado la mejora en la calidad de la pintura, sujeciones y dimensiones de los juegos.

¿Queremos conocer qué porcentaje se invirtió en el área de vialidad y en que programas?

La intervención vial como Municipio del Cantón Morona acorde a las competencias que es en el área urbana de las parroquias y aprobadas mediante ordenanza, se ha venido ejecutando mediante ejecución por administración directa con maquinaria del GMCM y también mediante proyectos de obra contratadas, que a continuación se detalla:

INTERVENCION POR ADMINISTRACION DIRECTA			
Mantenimiento de viabilidad			
PARROQUIA	SECTOR	AREA (M2) INTERVENID	INVERSION
Sevilla Don Bosco	Santa Rosa	8000	4000
	San Ramón	5000	2500
	Anillo Yurán – Cusuimi – 18 de Febrero – Chiriap – Santa Rosa	130000	65000
Sinai	centro parroquial	12000	6000
9 de Octubre	centro parroquial	8000	4000
Rio Blanco	centro parroquial	6400	3200
Proaño	centro parroquial	8000	4000
	Huacho	12000	6000
San Isidro	centro parroquial	8000	4000
Macas	Bacheo de calles de la ciudad	2400	26400
	Barrio Jardín del Upano	24000	12000
	Barrio 5 de Octubre	25600	12800
	Barrio Tinguichaca	32000	16000

Construccion y mantenimientos de vias			
PARROQUIA	SECTOR	VOLUMEN (M3)	INVERSION
Macas	Reencauzamiento del río Upano	4000	20000
	Conformación de la estructura de las calles del barrio 27 de Febrero, Barrio Barranco	12000	114000
San Isidro	San Isidro - Río Pujo, paso alterno	6552	62244
SUBTOTAL 1			362.144,00
OBRAS CONTRATADAS			
DESCRIPCION - OBRA			INVERSION
Estructura de via previo al ASFALTADO DE CALLES PARA LOS BARRIOS 27 DE FEBRERO, LA UNIÓN, LA BARRANCA Y JUAN DE LA CRUZ DE LA CIUDAD DE MACAS 2022			636.170,19
Regeneracion Urbana de la Av. Jaime Roldos etapa 1, doble tratamiento bituminoso en barrios			1.116.546,62
SUBTOTAL 2			1.752.716,81
TOTAL			2.114.860,81
			OBSERVACIONES
			Se realizara contrato complementario
			Se realizara contrato complementario

La inversión hasta la presente fecha en el área vial se ha invertido \$ 2.114.860,81 dólares americanos.

¿Queremos conocer por que no se concluye con la obra del alumbrado en la calle Desiderio Andramuño?

Esta obra se ha mantenido suspendida debido a que no se ha podido realizar la limpieza o desbroce de la franja de seguridad de las líneas y redes eléctricas para autorizar la conexión y funcionamiento, ya que el propietario del terreno no ha permitido realizar estos trabajos. Se ha oficiado al departamento Jurídico y a la comisaria para que se intervenga y permita concluir estos trabajos (adjunto memorando del fiscalizador que detalla los mismos). Es importante señalar que esta es una obra de alumbrado público del Gobierno Municipal y para su puesta en funcionamiento tiene que cumplirse con normas y procedimientos ante la Empresa Eléctrica CENTROSUR, razón por la cual, se insiste en hacer cumplir las Ordenanzas Municipales a los propietarios de los terrenos de mantener libres de árboles, arbustos y maleza que afectan al sistema eléctrico a lo largo de toda la obra de la Av. Desiderio Andramuño. Por este motivo, no se ha podido realizar la liquidación y la recepción provisional de la obra. Hasta la fecha 01 de abril de 2024 estos trabajos de limpieza y desbroce no han sido realizados.

¿queremos conocer por que no se concluyen con los trabajos en la calle Nuñez de Bonilla?

La obra denominada ASFALTADO DE CALLES PARA LOS BARRIOS 27 DE FEBRERO, LA UNIÓN, LA BARRANCA Y JUAN DE LA CRUZ DE LA CIUDAD DE MACAS 2022, contempla la ejecución de la calle Nuñez de Bonilla, como se explicó en el ítem 2.5 se ha mantenido suspendida debido a que varias vías correspondientes al proyecto no contaban con la estructura de mejoramiento, debido a que en los estudios no se contempló estos trabajos y que son necesarios ejecutarlos para garantizar la estructura de la vía. Por tanto, el GMCM mediante el departamento de Obras Publicas procede a la ejecución del mejoramiento de las vías PARROQUIA SECTOR VOLUMEN (M3) INVERSION Macas Reencauzamiento del río Upano 4000 20000 Conformación de la estructura de las calles del barrio 27 de Febrero, Barrio Barranco 12000 114000 San Isidro San Isidro – Río Pujo, paso alterno 6552 62244 SUBTOTAL 1 362.144,00 INVERSION OBSERVACIONES 636.170,19 Se realizara contrato complementario 1.116.546,62 Se realizara contrato complementario SUBTOTAL 2 1.752.716,81 TOTAL 2.114.860,81 DESCRIPCION – OBRA Estructura de vía previo al ASFALTADO DE CALLES PARA LOS BARRIOS 27 DE FEBRERO, LA UNIÓN, LA BARRANCA Y JUAN DE LA CRUZ DE LA CIUDAD DE MACAS 2022 Regeneración Urbana de la Av. Jaime Roldos etapa 1, doble tratamiento bituminoso en barrios OBRAS CONTRATADAS Construcción y mantenimientos de vías 5 Actualmente el contratista se encuentra realizando el stock y tendido de subbase en las calles del barrio 27 de febrero, luego se continuara con la base. Concluidos los trabajos en el barrio 27 de febrero se continuará en la calle Nuñez de Bonilla, en los trabajos de la vía y de veredas.

Queremos una explicación de los convenios que se realizaron con el GAD Parroquial de Sevilla durante el año 2023.

A continuación detalló los convenio suscritos con el Gad de Sevilla Don Bosco:

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL A EFECTOS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FACILITE UN PROFESIONAL O TÉCNICO DE LA ENTIDAD MUNICIPAL EN MATERIA DE SU COMPETENCIA PROPORCIONE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO, A FIN DE EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE TALENTO HUMANO EN EL GAD DE SEVILLA DON BOSCO, POR EL LAPSO DE DOS MESES UNA VEZ POR SEMANA.

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS SIN RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO, PARA LA “ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CAPTACION DE AGUA PARA LA COMUNIDAD CHIRIAPA-AMAZONAS”.

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL, ES LA "TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA A FAVOR DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO CUBIERTO Y CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA COMUNIDAD 18 DE FEBRERO, CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO CUBIERTO DEL SECTOR LA INMACULADA DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE, CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA ESPERANZA, CONSTRUCCIÓN DE LA PANELERA EN LA COMUNIDAD SAN VICENTE, CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO CUBIERTO EN LA COMUNIDAD DE NUMPAIM".

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS SIN RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CULTURALES EN LAS COMUNIDADES SHUAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES EN LA PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO". EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA DELEGA EN FORMA CONCURRENTES LAS COMPETENCIAS DE GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LOS GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES". AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE "LA UNIÓN Y SAUNTS".

¿Queremos conocer que acciones realizó el Municipio para recuperar los terrenos invadidos por personas particulares en los diferentes barrios de la ciudad de Macas?

Desde la fecha en la ha que venido ejerciendo las funciones como procurador sindico hasta la presente fecha no he recibido denuncias de ciudadanos que personas se hallen invadiendo predios de propiedad municipal. Así mismo debo informar que dentro de la institución existe un juicio vigente con el Señor Alcisar Cabrera, de un predio municipal emplazado tras del ECU-911, y al momento en la etapa procesal se encuentra en Casación.

¿Que porcentaje se invierte en el área ambiental y en que programas?

El presupuesto inicial de la Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos del periodo fiscal 2023 fue de \$ 2.553.170,91 y se ejecutó \$ 1.506.427,10 que corresponde al 60% de ejecución del presupuesto asignado inicialmente.

PROGRAMAS	Valor Inicial	Valor Pagado
CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL EN EL CANTON MORONA	201.965,00	90.393,15
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES)	149.108,43	84.587,17
<u>FAENAMIENTO</u> DE BOVINOS Y PORCINOS EN EL CAMAL MUNICIPAL	155.943,26	49.421,86
GESTION, MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES DEL CANTON MORONA	65.971,45	4.021,45
GESTION DE MERCADOS Y FERIAS	30.488,63	2.573,90
GESTION INTEGRAL DE DESECHOS	412.747,38	236.373,55
GESTION Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA	48.650,00	13.392,00
REGENERACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	130.339,00	6.040,00
REMUNERACIONES Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS	1.152.115,89	899.652,75
ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA CON EL BANCO	27.800,00	27.132,20
GESTION ADMINISTRATIVA	55.881,23	42.952,27
CONSULTORIA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA- ARRASTRE	46.422,56	2.971,36
ALQUILER MAQUINARIAS	75.738,08	46.915,44
TOTAL	2.553.170,91	1.506.427,10

¿QUEREMOS SABER CONOCER QUE PORCENTAJES SE INVIRTIÓ EN LA PARTE SOCIAL Y EN QUE PROGRAMAS?

PROGRAMA	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	PORCENTAJE
PROGRAMA VIDA ACTIVA Y EFECTIVA	132.933,20		100
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CONVENIO MIES	460819.93		85
TOTAL	593.753,13		92,5

Autogestión Alcaldía

Se gestionó 3' 003 813.68 ante la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica –CTEA.

Para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial y Tratamiento de aguas residuales de los barrios Jardín del Upano, 5 de Octubre Tinguichaca y partes del barrio Norte, La Florida y Nueva Jerusalén de la Ciudad de Macas, Cantón Morona.

Mediante CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE USO Y OCUPACIÓN GRATUITO DE ÁREA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS-INIAP.

ES IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CONJUNTA PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN, se recibió por parte del INIAP en comodato de 80 hectáreas que serán usadas como una zona de conservación, además para este proyecto también Mediante convenio interinstitucional firmando entre el Gobierno Provincial y Municipio de Morona se recibió 8 cámaras trampa, a comodato que servirán para levantamiento de información de fauna existen en el área protegida Bosque Domono.

COORDINAR ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA Y LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY A TRAVÉS DE SU FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS, CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR EL CURSO DE GUÍA TURÍSTICO LOCAL, CON UNA DURACIÓN DE 516 HORAS ACADÉMICAS DIRIGIDO A 25 PERSONAS BAJO LA MODALIDAD HÍBRIDA PARA LO CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE CONVENIO LA PROPUESTA CURRICULAR Y METODOLÓGICA VINCULADA A LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE GUÍANZA EN EL CANTÓN MORONA

ESTABLECER LÍNEAS DE COOPERACIÓN ENTRE LA CASA DE LA CULTURA Y EL GAD CANTONAL DE MORONA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO CULTURAL DEL CANTÓN, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ARTÍSTICOS CULTURALES, LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA PRODUCCIÓN, INTERPRETACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LA JURISDICCIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES QUE GARANTICEN EL APOYO INTERINSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD CULTURAL DE LA JURISDICCIÓN
